

Kundennr.:

Name:

**Energieversorger / Netzbetreiber:**

EVU / VNB:	<input type="text"/>
PLZ / Ort:	<input type="text"/>

**Ausführung der Zählerplätze:**

<input type="checkbox"/>	3-PKT
<input type="checkbox"/>	eHZ (inkl. BKE-OK)

**Angaben zum Schrank:**

Ausführung des Schrankes:  AP - IP43

Bauhöhe des Schrankes:  1150 mm (1-stöckig)

AP - IP54

UP - IP30

1450 mm (2-stöckig)

**Auswahl der Felder:**


<input type="checkbox"/>	Zählerplätze (für Aussetzbetrieb $\leq 63A$ )
<input type="checkbox"/>	Zählerplätze (für <b>Dauerbetrieb</b> $\leq 32A$ )
<input type="checkbox"/>	Zählerplätze (für <b>Dauerbetrieb</b> $\leq 44A$ )

**Aufschlüsselung der Dauerbetrieb - Zählerplätze:**

<input type="checkbox"/>	Wärmepumpe (mit Bestückungspaket)
<input type="checkbox"/>	PV-Überschuss (mit Bestückungspaket)
<input type="checkbox"/>	E-Mobil / Ladestation

<input type="checkbox"/>	Zähler - Reserveplätze (unverdrahtet)
<input type="checkbox"/>	TSG / Uhrenplatz inkl. Steuersicherung
Menge <input type="text"/>	Verteilerfeld(er) <input type="checkbox"/> APZ <input type="checkbox"/> Sammelschiene
Menge <input type="text"/>	Telekommunikationsfeld <input type="checkbox"/> APZ

**Skizze:**

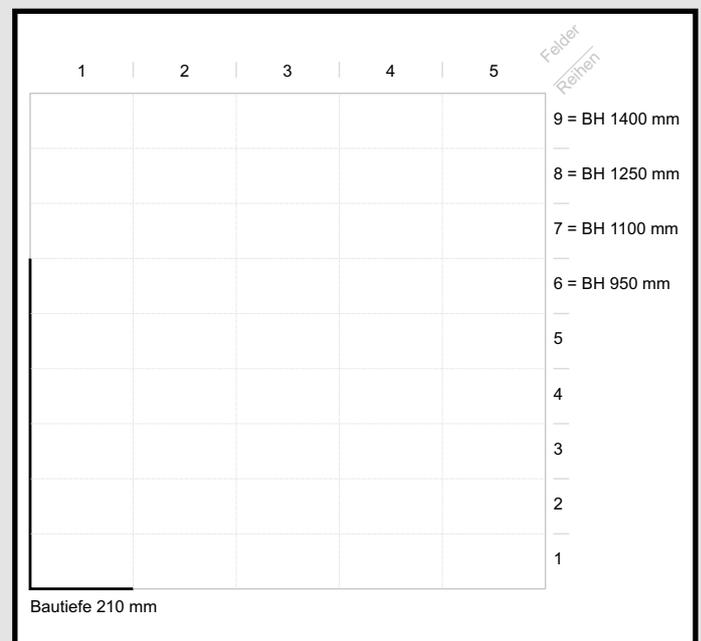

**Zubehör:**

HSA / SLS-Schalter: 25A 35A 40A 50A 63A

3-polig:      Stk.

1-polig:      Stk.

<input type="checkbox"/>	Einspeiseadapter 5-polig bis 25mm <sup>2</sup> <small>(ersetzt die im Schrank enthaltenen Sammelschienenklemmen 35mm<sup>2</sup>)</small>
<input type="checkbox"/>	Einspeisegehäuse 120mm <sup>2</sup> Montage: <input type="checkbox"/> seitlich <input type="checkbox"/> unten

<input type="checkbox"/>	APZ-Spannungsversorgung D01 6A 1-polig
<input type="checkbox"/>	APZ-Spannungsversorgung LS B6A 1-polig 25kA
<input type="checkbox"/>	RJ45-Satz gem. VDE-AR-N 4101
<input type="checkbox"/>	Überspannungsschutz* Typ 1+2+3 / 7,5kA <small>Für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz / Fangeinrichtung</small>
<input type="checkbox"/>	Überspannungsschutz* Typ 1+2+3 / 12,5kA <small>Für Gebäude mit und ohne äußeren Blitzschutz / Fangeinrichtung</small>

<input type="checkbox"/>	Stk.	Zählersteckklemme DS 63A komplett
<input type="checkbox"/>	Stk.	Zählersteckklemme WS 63A komplett
<input type="checkbox"/>	Stk.	Patchfeld 12-fach (im TK-Feld)
<input type="checkbox"/>	Stk.	Keystone Cat. 6a für Patchfeld
<input type="checkbox"/>	Stk.	Schukosteckdose 3-fach (im TK-Feld)
<input type="checkbox"/>	Stk.	Gerätehalter (für Router etc.)

\*für Sammelschienenmontage im NAR
