

Kundennr.:

Name:

**Energieversorger / Netzbetreiber:**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| EVU / VNB: | <input type="text"/> |
| PLZ / Ort: | <input type="text"/> |

**Ausführung der Zählerplätze:**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3-PKT              |
| <input type="checkbox"/> | eHZ (inkl. BKE-OK) |

**Angaben zum Schrank:**

Ausführung des Schrankes:  AP - IP43

Bauhöhe des Schrankes:  1150 mm (1-stöckig)

AP - IP54

UP - IP30

1450 mm (2-stöckig)

**Auswahl der Felder:**


|                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Zählerplätze (für Aussetzbetrieb $\leq 63A$ )      |
| <input type="checkbox"/> | Zählerplätze (für <b>Dauerbetrieb</b> $\leq 32A$ ) |
| <input type="checkbox"/> | Zählerplätze (für <b>Dauerbetrieb</b> $\leq 44A$ ) |

**Aufschlüsselung der Dauerbetrieb - Zählerplätze:**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Wärmepumpe (mit Bestückungspaket)    |
| <input type="checkbox"/> | PV-Überschuss (mit Bestückungspaket) |
| <input type="checkbox"/> | E-Mobil / Ladestation                |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>   | Zähler - Reserveplätze (unverdrahtet)  |
| <input type="checkbox"/>   | TSG / Uhrenplatz inkl. Steuersicherung   |
| Menge <input type="text"/> | Verteilerfeld(er)<br><input type="checkbox"/> APZ <input type="checkbox"/> Sammelschiene |
| Menge <input type="text"/> | Telekommunikationsfeld<br><input type="checkbox"/> APZ                                   |

**Skizze:**

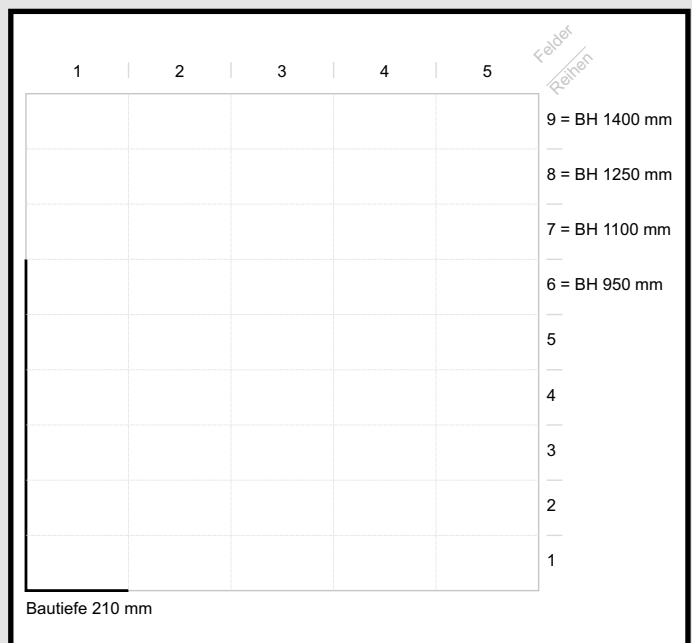

**Zubehör:**

HSA / SLS-Schalter: 25A 35A 40A 50A 63A

3-polig:      Stk.

1-polig:      Stk.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Einspeiseadapter 5-polig bis 25mm <sup>2</sup><br><small>(ersetzt die im Schrank enthaltenen Sammelschienenklemmen 35mm<sup>2</sup>)</small> |
| <input type="checkbox"/> | Einspeisegehäuse 120mm <sup>2</sup> Montage: <input type="checkbox"/> seitlich <input type="checkbox"/> unten                                |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | APZ-Spannungsversorgung D01 6A 1-polig   |
| <input type="checkbox"/> | APZ-Spannungsversorgung LS B6A 1-polig 25kA  |
| <input type="checkbox"/> | RJ45-Satz gem. VDE-AR-N 4101   |
| <input type="checkbox"/> | Überspannungsschutz* Typ 1+2+3 / 7,5kA<br><small>Für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz / Fangeinrichtung</small>          |
| <input type="checkbox"/> | Überspannungsschutz* Typ 1+2+3 / 12,5kA<br><small>Für Gebäude mit und ohne äußeren Blitzschutz / Fangeinrichtung</small> |

|                          |      |                                     |
|--------------------------|------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Stk. | Zählersteckklemme DS 63A komplett   |
| <input type="checkbox"/> | Stk. | Zählersteckklemme WS 63A komplett   |
| <input type="checkbox"/> | Stk. | Patchfeld 12-fach (im TK-Feld)      |
| <input type="checkbox"/> | Stk. | Keystone Cat. 6a für Patchfeld      |
| <input type="checkbox"/> | Stk. | Schukosteckdose 3-fach (im TK-Feld) |
| <input type="checkbox"/> | Stk. | Gerätehalter (für Router etc.)      |

\*für Sammelschienenmontage im NAR
